
COMUNE DI SASSARI

PROVINCIA DI SASSARI



Settore Lavori pubblici e Manutenzione del patrimonio comunale
-Servizio Impianti Sportivi-
Sede in Via Goffredo Mameli 68 - SASSARI (SS)

CART. 23_039 - FASCICOLO 2023/161- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA SACRO CUORE INFANZIA E DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CRAL"

Progetto Definito-Esecutivo

ELABORATO:
Cronoprogramma dei lavori

UBICAZIONE:
Via S. Josemaria Escrivà - 07100 Sassari-
Via Pirandello, 1 - 07100 Sassari-

DATA:
Luglio 2024


ALL.12

Oggetto:

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CIG. A03B461158
CUP. B82B23000860004

STUDIO TECNICO	DIRIGENTE DEL SETTORE	RESPONSABILE DEL PROGETTO
Progettista: Arch. Mario Nigra Firmato digitalmente da **MARIO NIGRA** CN = NIGRA MARIO O = Ordine degli Architetti di Sassari C = IT	Ing. Pier Giovanni Melis	Ing. Francesco Canu

ID	Nome attivita'	Durata
1	**"CRAL"**	42 g
2	ACCANTIERAMENTO	2 g
3	RIMOZIONI MANTO ERBA SINTETICA	3 g
4	PULITURA SUPERFICI TRUBUNE	2 g
5	REALIZZAZIONE NUOVO MANTO ERBA SINTETICA	10 g
6	REALIZZAZIONE CAMPO DA PADEL	22 g
7	PITTURE TRIBUNE	3 g
8	SOSTITUZIONE PROIETTORI	2 g
9	PULIZIA CIRCUITO SMALTIMENTO ACQUE PèIOVANE E MANUTENZIONE RETE PERIMETRALE	3 g
10	**PALESTRA SCUOLA INFANZIA SACRO CUORE**	40 g
11	ACCANTIERAMENTO	2 g
12	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	4 g
13	SOSTITUZIONE INFISSI	10 g
14	RISANAMENTO MURATURE	3 g
15	IMPIANTI IDRICI	7 g
16	INTONACI	2 g
17	RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	5 g
18	SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI	1 g
19	TINTEGGIATURE INTERNE	7 g
20	TINTEGGIATURE ESTERNE	2 g

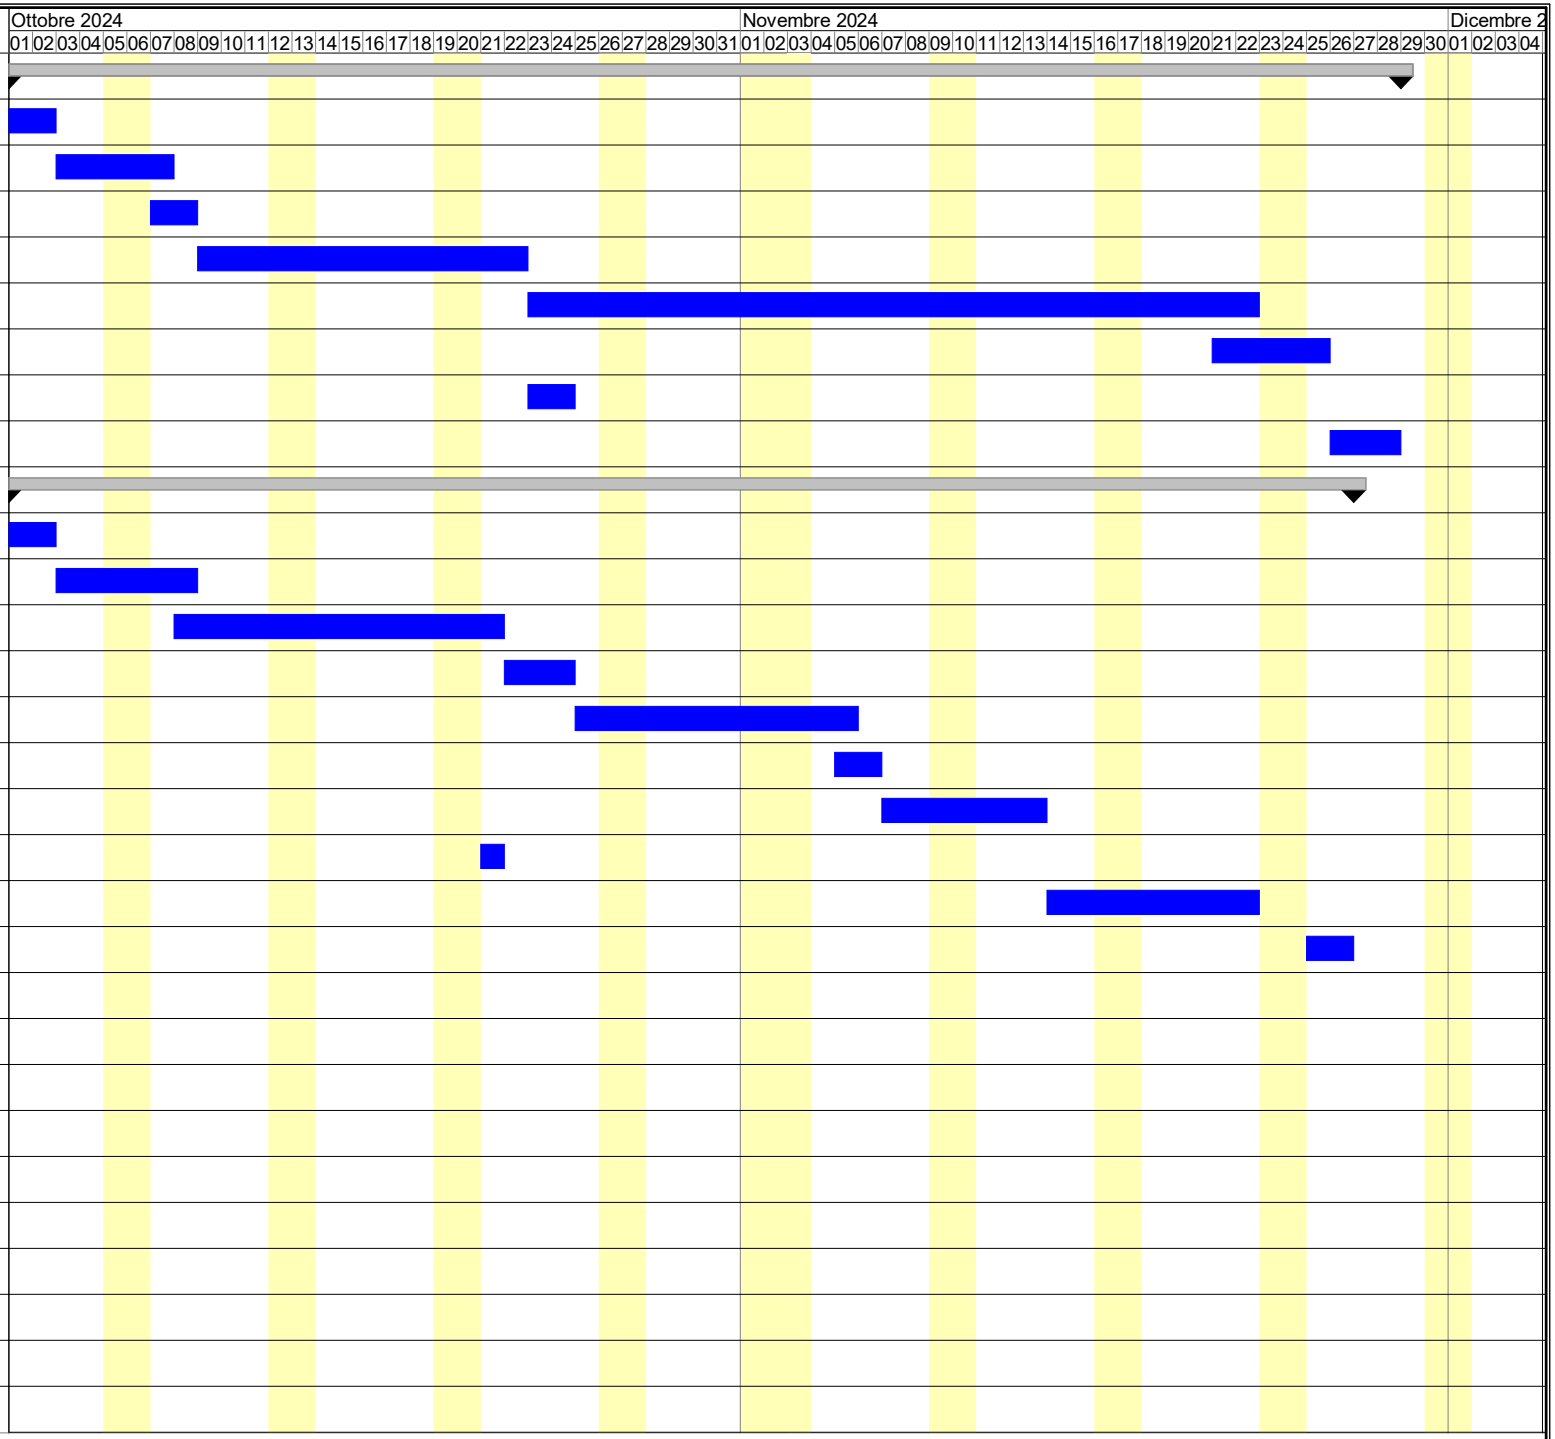

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
"CRAL"	**0,00**	**0,000**	**01/10/2024**	**28/11/2024**	**42**	**59**
* ACCANTIERAMENTO	0,00	0,000	01/10/2024	02/10/2024	2	2
* RIMOZIONI MANTO ERBA SINTETICA	0,00	0,000	03/10/2024	07/10/2024	3	5
* PULITURA SUPERFICI TRUBUNE	0,00	0,000	07/10/2024	08/10/2024	2	2
* REALIZZAZIONE NUOVO MANTO ERBA SINTETICA	0,00	0,000	09/10/2024	22/10/2024	10	14
* REALIZZAZIONE CAMPO DA PADEL	0,00	0,000	23/10/2024	22/11/2024	22	31
* PITTURE TRIBUNE	0,00	0,000	21/11/2024	25/11/2024	3	5
* SOSTITUZIONE PROIETTORI	0,00	0,000	23/10/2024	24/10/2024	2	2
* PULIZIA CIRCUITO SMALTIMENTO ACQUE PèIOVANE E MANUTENZIONE RETE PERIMETRALE	0,00	0,000	26/11/2024	28/11/2024	3	3
PALESTRA SCUOLA INFANZIA SACRO CUORE	**0,00**	**0,000**	**01/10/2024**	**26/11/2024**	**40**	**57**
* ACCANTIERAMENTO	0,00	0,000	01/10/2024	02/10/2024	2	2
* DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	0,00	0,000	03/10/2024	08/10/2024	4	6
* SOSTITUZIONE INFISSI	0,00	0,000	08/10/2024	21/10/2024	10	14
* RISANAMENTO MURATURE	0,00	0,000	22/10/2024	24/10/2024	3	3
* IMPIANTI IDRICI	0,00	0,000	25/10/2024	05/11/2024	7	12
* INTONACI	0,00	0,000	05/11/2024	06/11/2024	2	2
* RIVESTIMENTI E PAVIMENTI	0,00	0,000	07/11/2024	13/11/2024	5	7
* SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI	0,00	0,000	21/10/2024	21/10/2024	1	1
* TINTEGGIATURE INTERNE	0,00	0,000	14/11/2024	22/11/2024	7	9
* TINTEGGIATURE ESTERNE	0,00	0,000	25/11/2024	26/11/2024	2	2

Data, 23/07/2024

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Tecnico Arch. Mario Nigra						
